

Dodatek č.1

Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/1647/2017
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v Podještědí

Se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 00260576

DIČ: CZ00260576

Zastoupené Jiřím Rýdlem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen „objednatel“

a

„Společnost – Jablonné“

SYNER, s.r.o. (jako vedoucí společník)

Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Kobrle,

Jednatelé společnosti SYNER, s.r.o., na základě plné moci
ze dne 26.6.2017

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

SILNICE GROUP a.s. (jako společník)

Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen „zhotovitel“

Takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OVV/1647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ (dále jen „smlouva“)
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **782 456,91 Kč včetně DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

▪ Cena dle smlouvy bez DPH	10 820 389,00 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	677 228,55 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	30 569,95 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	707 798,50 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	646 658,60 Kč
▪ DPH 21%	135 798,31 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	782 456,91 Kč
▪ CENA CELKEM bez DPH dle Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	11 467 047,60 Kč
▪ DPH 21% CELKEM	2 408 080,00 Kč
▪ CENA CELKEM včetně DPH dle Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OVV/1647/2017	13 875 127,60

4. Z důvodu opravy v čl. XIX odst. 7, věta druhá, text:

„Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Jablonné v Podještědí č. 1540/2017 ze dne 18. 8. 2017“

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Smlouva byla schválena usnesením Rady města Jablonné v Podještědí č. 1540/2017 ze dne 18. 8. 2017“

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
Příloha č. 2 – Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

AKCE B - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovň. přejezd

Dne 20.9.2017 byla uzavřena smlouva o provedení stavby k veřejné zakázce Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa pro úseky č.16 - Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 a úsek č. 18 - Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovňový přejezd.

Dne 4.12.2017 obdržel zadavatel žádost ze Státního fondu dopravní infrastruktury o zajištění souladu projektové dokumentace a podmínek poskytovatele dotace a tedy žádost o úpravu projektové dokumentace s ohledem na bezpečnost, bezbariérovost a ochranu chodců.

Tyto změny vznikly až po ukončení zadávacího řízení.

SO 121 – Chodníky úsek 16

Úpravy týkající se úseku 16, tedy „Silnice II/270, úsek od mostu 270 – 014 po křiž. s III/27019

Km 0,247 – 0,262 vlevo se týkají přidání parkovacího zálivu pro zásobování č. p. 258. Parkovací záliv bude přidán na úkor zúžení chodníku na min. 1,5 m. Pozemek 1262/4 v majetku Libereckého kraje, ostatní plocha, silnice. Pozemek je součástí územního rozhodnutí i stavebního povolení.

SO 121 – Chodníky úsek 18

Úpravy týkající se úseku 18, tedy „Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrov. přejezd“

1. Km 0,082 – 0,109 vlevo na náměstí Míru – bude navržen nový chodník ve stávající zelené ploše v délce cca 27 m, v šířce 2 m. na pozemku 1262/1. Tento pozemek je součástí územního rozhodnutí i stavebního povolení a je zapsán jako ostatní plocha, ostatní komunikace, jeho vlastníkem je město Jablonné v Podještědí.

2. Na náměstí míru, na křižovatce s ul. školní bude navržena úprava stávajícího chodníku, tak aby bylo umožněno bezpečnější a bezbariérové přecházení (doplnění a snížení obruby a varovného pásu) u č.p. 4 a 13. Pozemek 1262/35 v majetku města Jablonné v Podještědí, ostatní plocha, ostatní komunikace – je součástí územního rozhodnutí i stavebního povolení.


3. V místě autobusových zastávek v km 0,137 vlevo – bude navrženo nové místo pro přecházení přes boční ulici vedoucí na nástupiště autobusové zastávky. S tím související zvětšení zpevněné plochy chodníku na pozemku 64/1. Pozemek je v majetku města Jablonné v Podještědí, zapsán jako ostatní plocha, zeleň. Je součástí územního rozhodnutí a stavebního povolení. Již před touto úpravou byla na pozemek umístěována zpevněná plocha.

4. Km 0,200 vpravo – křižovatka ulic Zdislavy z Lemberka x Smetanova. V původním projektu byl navržen chodníkový přejezd do ul. Smetanova. Na základě pasportu komunikací, bude upraveno na klasickou stykovou křižovatku (stejně jako současný stav).

Vícepráce (odst. § 222, odst. 4 zákona)

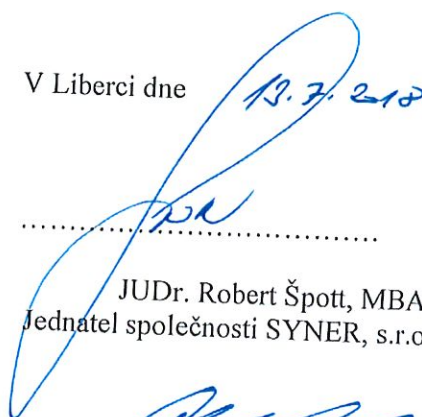
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněn objednatelům v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byla schválen usnesením Rady města Jablonné v Podještědí RM č. 2143/2018 ze dne 11.7.2018.

V Jablonném v Podještědí dne 12.7.2018.


Jiří Rýdl
Starosta města Jablonné v Podještědí



V Liberci dne 13.7.2018


JUDr. Robert Špott, MBA
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.


Ing. Dalibor Koblík
Jednatel společnosti SYNER, s.r.o.


Ing. Karel Rypl, předseda
představenstva společnosti
SILNICE GROUP a.s.



Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Soupis položek je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1.

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

SO 121 – Chodníky úsek 16

Km 0,247-0,262 vlevo – přidáním parkovacího zálivu pro zásobování č.p. 258 byl zúžen chodník na šířku min. 1,5 m. Méněpráce se týkají položek souvisejících s tímto zúžením chodníku.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON	t	23,2	90	2 095,56 Kč
014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU KAMENIVO	t	0,4	1	0,40 Kč
11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	t	0,22	220	48,62 Kč
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	t	0,68	795	536,63 Kč
58221.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	t	18,50	950	17575,00 Kč
58241.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	t	1,90	2300	4370,00 Kč
58271.b	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	t	1,50	2500	3750,00 Kč
12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	t	8,775	250	2193,75 Kč
CELKEM					28376,20 Kč

SO 121 – Chodníky úsek 18

Přidáním chodníku v km 0,082 – 0,109 na náměstí Míru a u autobusové zastávky v km 0,137, došlo oproti původnímu projektu ke zmenšení zelené plochy. Méněpráce se týkají položek souvisejících s tímto zmenšením.

12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	t	8,775	250	2193,75 Kč
CELKEM					2193,75 Kč

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa

▪ Cena dle smlouvy bez DPH	10 820 389,00 Kč
----------------------------	------------------

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	677 228,55 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce	30 569,95 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	707 798,50 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	646 658,60 Kč
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH	782 456,91 Kč
▪ DPH 21%	135 798,31 Kč

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost Jablonné
SYNER s.r.o.

.....

**Projektant/
AD** : VALBEK, spol. s r.o.

.....

TDI : 3L studio s.r.o.

.....

**Zástupce
objednatele** : Město Jablonné v
Podještědí

.....





Firma: SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KCE B Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úroveň přelozd
Místo Silnice II/270, úsek od křiž. a II/27010 po úroveň přelozd
SO 121 CHODNÍKY
121.2 CHODNÍKY - INVESTOREM MÍSTO

121.2	3 170 201,22	000 123,65	3 830 384,77
-------	--------------	------------	--------------

Objekt:

Rozpočet:

Ref. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	Celkem	množství změna	cena změna	množství změna	celková cena změna
0	014102.a	Všeobecná konstrukce a práce								
1	014102.a	POPLATEK ZA SKLÁDKU	T	59,854	00,00	39 835,80		2 220,57		42 124,38
cena z ús. 10	14101	POPLATEK ZA SKLÁDKU	M3		1,00	5 380,80	23,675	2 130,75	83,520	7 517,61
2	014102.b	ZEMINA						5,880	5,880	5,880
3	014102.c	POPLATEK ZA SKLÁDKU	T	008,102	1,00	509,10	91,943	91,94	1 000,045	1 000,05
4	02730	ŽIVICE	T	68,892	270,00	18 600,84	0,000	0,00	68,892	18 600,84
		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZA JIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI	KC	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00
		Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury během celé stavby, vč. dočasných								
5	11313	Zemní práce								
		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	28,705	350,00	250 204,24		35 074,55		285 278,79
6	11317.a	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	7,143	230,00	1 042,89	0,000	0,00	7,143	1 042,89
		VČ ODVOZU NA DEPONII URČENOU ZADAVATELEM DO 20KM								
7	11317.b	VČ VYTRÍDĚNÍ A OČIŠTĚNÍ KOSTEK OD ZBYLÉHO MATERIÁLU, ZBYLÝ MATERIÁL	M3	1,200	230,00	276,00	0,000	0,00	1,200	276,00
		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	3,050	750,00	2 287,50	0,000	0,00	3,050	2 287,50
8	11318.a	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	10,121	750,00	14 340,75	3,024	2 268,00	22,145	16 608,75
9	11318.b	VČ ODVOZU POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a	M3	76,483	750,00	57 362,25	12,098	9 072,00	88,570	66 434,25
10	11318.c	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	604,501	220,00	110 990,22	51,080	11 237,60	555,581	122 227,82
		ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO	M3	604,501	220,00	110 990,22	51,080	11 237,60	555,581	122 227,82
12	11351	ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	334,700	30,00	10 041,00	0,900	9,00	335,600	10 050,00
		VČ ODVOZU POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a								
OTSKP 2017	11352	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR I	M		84,00	103,000	8 652,00	103,000	8 652,00	
cena z ús. 10	12373	ULOŽENÍ SYPAKŮ DO NÁSPUV A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		160,00	5,880	940,80	5,880	940,80	
cena z ús. 10	17120	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3		50,00	5,880	58,80	5,880	58,80	
13	12110	VČ ODVOZU NA MEZIDEPONII VYUŽIT SE V RAMCI STAVBY	M3	5,778	288,00	8,775	438,75	14,553	727,65	
14	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK A SKLADK TR I	M3	18,912	250,00	4 728,00	-8,775	-2 193,75	10,137	2 534,25
15	17120.b	DOVOZ A NÁKUP CHYBĚJÍCÍ ORNICE	M3	5,778	10,00	67,78	8,775	87,75	14,553	145,53
16	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	2 588,700	12,00	31 064,40	375,300	4 503,60	2 964,000	35 568,00
17	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVNĚ	M3	24,690	160,00	3 950,40	0,000	0,00	24,690	3 950,40
18	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	164,600	14,00	2 304,40	0,000	0,00	164,600	2 304,40
19	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	164,600	5,00	623,00	0,000	0,00	164,600	623,00
20	31717	Svlahč. konstrukce								
21	31732b	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	138,460	140,00	47 654,40	0,000	0,00	138,460	47 654,40
22	31736b	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO CSN27 (B37)	M3	2,300	9 600,00	19 384,00	0,000	0,00	2,300	19 384,00
		VYUŽITÍ ŘÍMS Z OCELI 10335, 10338	T	0,214	30 000,00	6 420,00	0,000	0,00	0,214	6 420,00
23	58330	Komunikace				2 217 751,78		428 355,43		2 644 107,20
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	418,245	795,00	330 119,78	57,918	48 042,43	473,163	376 162,20
24	58360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	18,975	800,00	15 180,00	0,000	0,00	18,975	15 180,00
25	58221.a	DLAŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 343,600	050,00	1 278 420,00	299,500	284 525,00	1 643,100	1 560 945,00
26	58221.b	KOSTKY TL 80MM VČ. LOŽNÉ VRSTVY	M2	91,200	950,00	86 640,00	7,000	8 650,00	98,200	93 290,00
27	58241.a	DLAŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	11,700	2 100,00	24 570,00	10,000	21 000,00	21,700	45 970,00
28	58241.b	KOSTKY TL 100MM VČ. LOŽNÉ VRSTVY	M2	14,500	2 300,00	34 270,00	2,100	4 830,00	17,000	39 100,00
29	58251.a	HLADKÉ DESKY 25X25CM TL 3CM	M2	7,000	400,00	2 800,00	3,000	1 200,00	10,000	4 000,00
30	58251.b	DLAŽENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	2,800	500,00	1 300,00	0,000	0,00	2,800	1 300,00
31	582811	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SĚDOCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	948,200	360,00	340 632,00	0,800	3 528,00	949,000	344 160,00
32	582812	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SĚDOCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	140,500	400,00	56 200,00	0,000	0,00	140,500	56 200,00
33	582814	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	8,400	450,00	3 780,00	0,000	0,00	8,400	3 780,00
34	58281A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,400	600,00	5 640,00	14,300	8 580,00	23,700	14 220,00
35	58281B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,600	750,00	7 200,00	0,000	0,00	9,600	7 200,00
cena z ús. 10	58271.a	CERVENÁ	M2							
		DLAŽENÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2		2 500,00		18,000	45 000,00	18,000	45 000,00
36	58271.b	RELIEFNI DLAŽBA Z UMĚLEHO KAMENE TL 3CM	M2	13,200	2 500,00	33 000,00	2,000	5 000,00	15,200	38 000,00
		DLAŽENÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2							
		RELIEFNI DLAŽBA Z UMĚLEHO KAMENE TL 6CM	M2							
37	62745	Úpravy povrchů, podlahy, výplně atv.								
		ISPAKOVÁNÍ STÁŘEHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	48,000	500,00	23 000,00	0,000	0,00	48,000	23 000,00
38	711117.a	Přídavná stavební práce	M2	213,900	250,00	53 475,00	26,700	8 675,00	240,600	60 150,00
39	78701a	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z NOPOVÉ FÓLIE	M2	5,000	250,00	1 250,00	0,000	0,00	5,000	1 250,00
40	89021	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKL OPU	KUS	8,000	1 200,00	9 600,00	0,000	0,00	8,000	9 600,00
41	89923	- poloha výškových úprav zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení	KUS	8,000	800,00	6 400,00	3,000	2 400,00	11,000	8 800,00
42	9111A3	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNČŮ	M	47,000	150,00	7 050,00	0,000	0,00	47,000	7 050,00
43	9112A1	Ostatní konstrukce a práce								
		ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	23,000	2 850,00	65 550,00	0,000	0,00	23,000	65 550,00
44	91710	VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ ZADAVATELEM, PŘEDPOKLAD DO 20KM	M							
		ZÁBRADÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,602	20 000,00	12 040,00	0,000	0,00	0,602	12 040,00
45	917211	TRÁMADLOVÉ VČ PRO RAL 7011	M	158,000	200,00	31 200,00	0,000	0,00	158,000	31 200,00
46	917224	ROZLIŠNĚNÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,000	320,00	2 240,00	0,000	0,00	7,000	2 240,00
47	91723	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	40,000	230,00	9 200,00	0,000	0,00	40,000	9 200,00
48	91741	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKU	M	188,000	1 000,00	188 000,00	48,000	48 000,00	236,000	236 000,00
49	91742	ZAHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM	M	6,000	1 200,00	7 200,00	122,000	148 400,00	128,000	155 600,00
50	93723.a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	600,00	4 800,00	0,000	0,00	8,000	4 800,00
51	93767.a	MOBILNÍ - DEMONTÁŽ BETONOVÝCH KVĚTINÁČŮ	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00
52	93767.b	MOBILNÍ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00
53	93767.c	MOBILNÍ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	80 000,00	160 000,00	0,000	0,00	2,000	160 000,00
54	938411	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTVÝSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	46,000	200,00	9 200,00	0,000	0,00	46,000	9 200,00
55	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,760	3 000,00	5 280,00	0,000	0,00	1,760	5 280,00
		VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a								



Firma SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ZE B Silnice II/270 Jablonná v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úroveň přejezdu
číslo silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s II/27019sú 121 CHODNÍKY
121.2 CHODNÍKY - INVESTOREM MĚSTO

121.2 1 301 020,30 0 105,00 1 400 725,30

Ukazatel:
Rozpočet:

Pol. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	možná změna	cena změna	návrhová položka	celková cena po změně
1	014102.a	Všeobecná kontrukce a práce	T	65,802	80,00	5 264,16	-23,28	-2 095,58	42,62	3 268,62
2	014102.b	POPLATEK ZA SKLÁDKU	T	375,694	1,00	375,69	-0,40	-0,40	375,30	375,30
3	014102.c	POPLATEK ZA SKLÁDKU	T	65,800	270,00	17 566,00	0,00	0,00	65,80	15 068,00
4	02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KC	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1,00	15 000,00
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	23,250	350,00	8 137,50	0,00	0,00	23,25	8 137,50
6	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU	M3	2,520	2 000,00	5 040,00	0,00	0,00	2,52	5 040,00
7	11317.a	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,860	230,00	195,80	0,00	0,00	0,86	195,80
8	11317.b	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	4,200	230,00	966,00	0,00	0,00	4,20	966,00
9	11318.a	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	12,360	750,00	9 270,00	0,00	0,00	12,36	9 270,00
10	11318.b	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	14,112	750,00	10 584,00	0,00	0,00	14,11	10 584,00
11	11318.c	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	3,528	750,00	2 646,00	0,00	0,00	3,53	2 646,00
12	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	208,710	220,00	45 918,18	-0,22	-48,62	208,69	45 869,56
13	11351	ODSTRANĚNÍ ZAKONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	48,000	30,00	1 440,00	0,00	0,00	48,00	1 440,00
14	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	21,500	100,00	2 150,00	0,00	0,00	21,50	2 150,00
15	12110	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	38,400	50,00	1 920,00	0,00	0,00	38,40	1 920,00
16	12573.a	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADKÉ TL. I	M3	3,780	250,00	945,00	0,00	0,00	3,78	945,00
17	17120	ULOŽENÍ BYPANNY DO NÁSTYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	38,400	10,00	384,00	0,00	0,00	38,40	384,00
18	19110	UPRAVA PLOŠE BEZ ZHUTNĚNÍ V HORIZONTNÍ TR. I	M2	951,200	12,00	11 414,40	10,10	121,20	961,30	11 535,60
19	19230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	42,180	100,00	4 218,00	0,00	0,00	42,18	4 218,00
20	19241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	281,200	14,00	3 936,80	0,00	0,00	281,20	3 936,80
21	19247	SEJNUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M2	281,200	5,00	1 406,00	0,00	0,00	281,20	1 406,00
22	66330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	158,810	795,00	126 053,95	-0,68	-536,63	158,13	125 517,33
23	66300	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2,535	600,00	1 521,00	0,00	0,00	2,54	1 523,54
24	6821.a	DLAŽENÉ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	6821.b	DLAŽENÉ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	100,500	650,00	65 325,00	-18,50	-17 875,00	82,00	47 450,00
26	6821.c	DLAŽENÉ KRYTÍ Z KAMEN. DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	4,500	2 100,00	9 450,00	0,00	0,00	4,50	9 450,00
27	6821.d	DLAŽENÉ KRYTÍ Z KAMEN. DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	6,400	2 300,00	14 720,00	-1,50	-4 370,00	4,90	10 350,00
28	68211	DESKY 25x25CM TL. 6CM	M2	151,000	300,00	45 300,00	0,00	0,00	151,00	45 300,00
29	68212	KRYTÍ Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁKEM. BĚDCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM.	M2	26,600	400,00	10 640,00	0,00	0,00	26,60	10 640,00
30	68214	KRYTÍ Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁKEM. BĚV TL. 60MM DO LOŽE Z KAM.	M2	5,700	450,00	2 565,00	0,00	0,00	5,70	2 565,00
31	6821A	ČERVENÝ OPTICKÝ PÁS NA BUS ZASTÁVKÁCH	M2	5,200	600,00	3 120,00	0,00	0,00	5,20	3 120,00
32	6821B	KRYTÍ Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁKEM. BĚV TL. 60MM DO LOŽE Z	M2	11,800	750,00	8 850,00	0,00	0,00	11,80	8 850,00
33	6821.c	ČERVENÁ	M2	0,500	2 500,00	1 250,00	0,00	1 250,00	7,00	17 500,00
34	6821.d	DLAŽENÉ KRYTÍ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,000	2 600,00	13 000,00	-1,50	-3 750,00	3,50	9 250,00
35	711117.a	Přidružení stavební výroba	M2	67,500	250,00	16 875,00	0,00	0,00	67,50	16 875,00
36	80921	VÝSKOVÁ OPRAVA POKLADU	KUS	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	2,00	2 400,00
37	80923	VÝSKOVÁ OPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	800,00	4 000,00	0,00	0,00	5,00	4 000,00
38	9111A1.a	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - PODÁVKA A MONTÁŽ	M	22,000	2 350,00	51 700,00	0,00	0,00	22,00	51 700,00
39	9111A1.b	DVOUMĚRÁDLOVÉ, VČ. PKO - RAL 7011	M	8,000	2 850,00	22 800,00	0,00	0,00	8,00	22 800,00
40	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	13,000	150,00	1 950,00	0,00	0,00	13,00	1 950,00
41	917211	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	01,000	200,00	2 000,00	0,00	0,00	01,00	2 000,00
42	91723	ZÁKONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM	M	41,000	230,00	9 430,00	0,00	0,00	41,00	9 430,00
43	91724	SILNIČNÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	330,000	0,00	0,00	17,00	5 610,00	17,00	5 610,00
44	93741	ZÁKONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 60MM	M	82,000	1 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82,00	82 000,00
45	93747	MOBILNÍ - PRÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1,00	80 000,00
46	93747.3	MOBILNÍ - PRÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00
47	00050	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ VČET STĚŽNÍKOVÝCH	M	1,000	600,00	600,00	0,00	0,00	1,00	600,00
