

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: **487 829 961, 487 829 960**
bankovní spojení : **č.ú. 903269369/0800, Česká spořitelna, a.s.**
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČO: **25042751**
DIČ: **CZ25042751**
zastoupený : **Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem**
tel/fax: **412 704 521 / -**
bankovní spojení : **Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.**
2572360297/0100 345172/0800
2654920227/0100
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Jindřich Švec - vedoucí OZ 02**
a následně jmenovaný stavbyvedoucí

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

Předmětem této smlouvy „**Obnova místních komunikací v Jablonném v Podještědí pro rok 2021 - Postřelná, Jablonné - kino, Petrovice, Heřmanice, Lvová**“

1. „Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
 - Soupisu prací
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvy
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Obnova místních komunikací v Jablonném v Podještědí pro rok 2021 - Postřelná, Jablonné - kino, Petrovice, Heřmanice, Lvová**“.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení
5. Místem plnění jsou místní komunikace v k.ú. Lvová, Jablonné v Podještědí, Petrovice, Heřmanice a Postřelná.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **5 měsíců** od podepsání Smlouvy o Dílo.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč 3 368 925,45 Kč,-- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 21%, tj. 4 076 399,79,- Kč. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.
2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede

ga

tyto vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli

3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.
4. Změna ceny díla v případě méněprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 30 dní po jejím doručení objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitosti podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnost.
8. Daňový doklad bude doručen do podatelny úřadu do 15 dnů po DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění).

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště

nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatelem.

5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
 - 2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
 - 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
10. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělků, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků není objednatel povinen převzít.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání

- díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamací uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
 4. Zhotovitel zároveň musí do 15-ti dnů po obdržení reklamací písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamací.
 5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamací.
 6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
 7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatele neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v touto smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
 8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
 9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
 10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tyto spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
 11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČSN 050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.
3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.
5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.
7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlících a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatelem předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,-Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatele, zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatele.
3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.

XIII. Závěrečná ustanovení


1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných posoupně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatele.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy : 1 x oceněný soupis prací


Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

V Jablonném v Podještědí: 14.6.2021.


objednatel

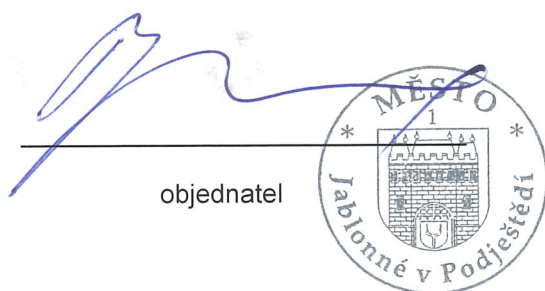

V Děčíně dne: 12.6.21



zhotovitel

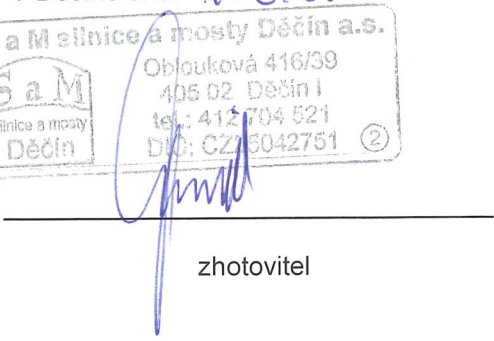

Schváleno usnesením R.O. č. 1296/2021
ze dne 27.1.2021



SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 25042751

Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

telefon 412 704 521, e-mail samdecin@sam-dc.cz

NABÍDKA:


**„Obnova místních komunikací v Jablonném v Podještědí pro rok 2021
– Postřelná, Jablonné – kino, Petrovice, Heřmanice, Lvová“**

NABÍDKOVÁ CENA - rekapitulace

Postřelná	370 278,50 Kč
Petrovice	779 649,00 Kč
Lvová za přejezdem	431 085,00 Kč
Lvová p.p.č. 909/1	275 987,50 Kč
Jablonné v Podještědí – kino	137 222,20 Kč
Heřmanice	232 552,50 Kč
Obnova mostu k č.p. 37 Heřmanice	1 142 150,75 Kč
celkem bez DPH	3 368 925,45 Kč
DPH ve výši 21%	707 474,34 Kč
celkem vč. 21% DPH	4 076 399,79 Kč


V Děčíně dne 4.1.2021

Petr Podrazil
výkonný ředitel




Postřelná

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 100 mm s vybouráním - zápich (včetně odvozu a skládkovného)	21,0	M2	150,00 Kč	3 150,00 Kč
002	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	1023,0	M2	9,00 Kč	9 207,00 Kč
003	938122211	Hubení porostů v podkladu komunikace herbicidy - postřikovačem	1023,0	M2	4,00 Kč	4 092,00 Kč
004	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	1023,0	M2	5,00 Kč	5 115,00 Kč
005	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	63,9	T	1 150,00 Kč	73 519,50 Kč
006	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	1023,0	M2	15,00 Kč	15 345,00 Kč
007	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - malý finišer	1023,0	M2	250,00 Kč	255 750,00 Kč
008	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou - PVH	21,0	M	100,00 Kč	2 100,00 Kč
009	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH					370 278,50 Kč	
DPH 21%					77 758,49 Kč	
Celkem včetně DPH					448 036,99 Kč	




Petrovice

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.i.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 100 mm s vybouráním - zápích (včetně odvozu a skládkovného)	18,0	M2	150,00 Kč	2 700,00 Kč
002	122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 - 4 objem do 100 m ³	25,6	M3	200,00 Kč	5 122,00 Kč
003	9970135r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	46,0	T	150,00 Kč	6 900,00 Kč
004	99701350r	Příplatek k odvozu výkopku a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	2944,0	T	8,00 Kč	23 552,00 Kč
005	1712012r	Poplatek za uložení výkopku na skládce (skládkovné)	46,0	T	150,00 Kč	6 900,00 Kč
006	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	2049,0	M2	9,00 Kč	18 441,00 Kč
007	583441690	Podklad ze štěrku tl. 100 mm (frakce 0 - 32 mm)	25,6	M3	800,00 Kč	20 480,00 Kč
008	57213131r	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	128,1	T	1 150,00 Kč	147 269,00 Kč
009	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	2049,0	M2	15,00 Kč	30 735,00 Kč
010	577144121r	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm - malý finišer	2049,0	M2	250,00 Kč	512 250,00 Kč
011	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou - PVH	18,0	M	100,00 Kč	1 800,00 Kč
012	4600100r	Vytýčení inženýrských sítí	1,0	soubor	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
013	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH					779 649,00 Kč	
DPH 21%					163 726,29 Kč	
Celkem včetně DPH					943 375,29 Kč	



Lvová za přejezdem

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 100 mm s vybouráním - zápich (včetně odvozu a skládkovného)	12,0	M2	200,00 Kč	2 400,00 Kč
002	122401401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 - 4 objem do 100 m3	13,1	M3	200,00 Kč	2 620,00 Kč
003	9970135r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	23,6	T	150,00 Kč	3 540,00 Kč
004	99701350r	Příplatek k odvozu výkopku a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	4179,0	T	5,00 Kč	20 895,00 Kč
005	1712012r	Poplatek za uložení výkopku ze sypaniny na skládce (skládkovné)	65,3	T	150,00 Kč	9 795,00 Kč
006	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	1089,0	M2	9,00 Kč	9 801,00 Kč
007	583441690	Podklad ze štěrkodře ŠD tl. 100 mm (frakce 0 - 32 mm)	13,1	M3	800,00 Kč	10 480,00 Kč
008	57213131r	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	68,1	T	1 150,00 Kč	78 269,00 Kč
009	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	1089,0	M2	15,00 Kč	16 335,00 Kč
010	577144121r	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - malý finišer	1089,0	M2	250,00 Kč	272 250,00 Kč
011	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou - PVH	12,0	M	100,00 Kč	1 200,00 Kč
012	4600100r	Vytyčení inženýrských sítí	1,0	soubor	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
013	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH					431 085,00 Kč	
DPH 21%					90 527,85 Kč	
Celkem včetně DPH					521 612,85 Kč	




Lvová p.p.č.909/1

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 100 mm s vybouráním - zápich (včetně odvozu a skládkování)	8,0	M2	200,00 Kč	1 600,00 Kč
002	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	750,0	M2	9,00 Kč	6 750,00 Kč
003	938122211r	Hubení porostů v podkladu komunikace herbicidy - postřikovačem	750,0	M2	4,00 Kč	3 000,00 Kč
004	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	750,0	M2	5,00 Kč	3 750,00 Kč
005	899331111	Výšková úprava vodovodního pokládky do 200 mm	1,0	KUS	750,00 Kč	750,00 Kč
006	572131311r	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	46,9	T	1 250,00 Kč	58 587,50 Kč
007	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	750,0	M2	15,00 Kč	11 250,00 Kč
008	577144121r	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - malý finišer	750,0	M2	250,00 Kč	187 500,00 Kč
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou - PVH	8,0	M	100,00 Kč	800,00 Kč
010	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH					275 987,50 Kč	
DPH 21%					57 957,38 Kč	
Celkem včetně DPH					333 944,88 Kč	

S a M silnice a
 ková 416/39
 02 Děčín I
 tel: 412 704 521
 DIČ: CZ25042751 ②
 Děčín


Jablonné v Podještědí - kino

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 100 mm s vybouráním - zápich (včetně odvozu a skládkovného)	15,0	M2	200,00 Kč	3 000,00 Kč
002	113154114	Frézování živичného krytu tl 50mm pruh š. od 0,5 m do 500 m2 bez překážek v trase	239,0	M2	55,00 Kč	13 145,00 Kč
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládkunebo na meziskládku do 1 km se složením	31,3	T	150,00 Kč	4 695,00 Kč
004	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	2003,2	T	6,00 Kč	12 019,20 Kč
005	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	31,3	T	160,00 Kč	5 008,00 Kč
006		Výšková úprava kanalizačního poklopu nebo vpusti	3,0	KUS	750,00 Kč	2 250,00 Kč
007		Výšková úprava poklopu	1,0	KUS	750,00 Kč	750,00 Kč
007	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	239,0	M2	5,00 Kč	1 195,00 Kč
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 115	19,5	T	1 310,00 Kč	25 545,00 Kč
007	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	239,0	M2	15,00 Kč	3 585,00 Kč
008	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - malý finišer	239,0	M2	270,00 Kč	64 530,00 Kč
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou - PVH	15,0	M	100,00 Kč	1 500,00 Kč
Celkem bez DPH					137 222,20 Kč	
DPH 21%					28 816,66 Kč	
Celkem včetně DPH					166 038,86 Kč	



Heřmanice

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 100 mm s vybouráním - zápich (včetně odvozu a skládkovného)	18,0	M2	150,00 Kč	2 700,00 Kč
002	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	637,0	M2	9,00 Kč	5 733,00 Kč
003	938122211	Hubení porostů v podkladu komunikace herbicidy - postřikovačem	637,0	M2	4,00 Kč	2 548,00 Kč
004	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	637,0	M2	5,00 Kč	3 185,00 Kč
005	899331111	Výšková úprava vodovodního poklopku do 200 mm	0,0	KUS	750,00 Kč	0,00 Kč
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	39,8	T	1 150,00 Kč	45 781,50 Kč
007	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	637,0	M2	15,00 Kč	9 555,00 Kč
008	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - malý finišer	637,0	M2	250,00 Kč	159 250,00 Kč
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou - PVH	18,0	M	100,00 Kč	1 800,00 Kč
010	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,0	soubor	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH					232 552,50 Kč	
DPH 21%					48 836,03 Kč	
Celkem včetně DPH					281 388,53 Kč	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200227
Stavba: Obnova mostu k č.p. 37 Heřmanice

KSO:
Místo: Heřmanice v Podj.

CC-CZ:
Datum: 04.01.2021

Zadavatel:
město Jablonné v Podj.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
KH Mosty

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 142 150,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 142 150,75	239 851,66
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 382 002,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200227

Stavba: Obnova mostu k č.p. 37 Heřmanice

Místo: Heřmanice v Podj.

Datum: 04.01.2021

Zadavatel: město Jablonné v Podj.

Projektant: KH Mosty

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 142 150,75	1 382 002,41
20200227	Obnova mostu k č.p. 37 Heřmanice	1 142 150,75	1 382 002,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova mostu k č.p. 37 Heřmanice

KSO:

Místo: Heřmanice v Podj.

CC-CZ:

Datum: 04.01.2021

Zadavatel:

město Jablonné v Podj.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

KH Mosty

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 142 150,75

DPH základní
snížená

Základ daně
1 142 150,75
0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	239 851,66
15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 382 002,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

22 701

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova mostu k č.p. 37 Heřmanice

Místo:

Heřmanice v Podj.

Zadavatel:

město Jablonné v Podj.

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:

04.01.2021

Projektant:

KH Mosty

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 142 150,75

HSV - Práce a dodávky HSV

927 282,15

1 - Zemní práce

217 002,20

2 - Zakládání

127 291,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

237 110,69

4 - Vodorovné konstrukce

102 118,00

5 - Komunikace pozemní

35 768,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

107 660,00

997 - Přesun sutě

86 239,66

998 - Přesun hmot

14 092,16

PSV - Práce a dodávky PSV

16 868,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16 868,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

198 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

110 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

57 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

31 000,00

23 Pa

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova mostu k č.p. 37 Heřmanice

Místo:

Heřmanice v Podj.

Datum:

04.01.2021

Zadavatel:

město Jablonné v Podj.

Projektant:

KH Mosty

Uchazeč:

SAH silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel:

J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 142 150,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				927 282,15	
D	1		Zemní práce				217 002,20	
1	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	27,000	50,00	1 350,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	27,000	60,00	1 620,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				27,000			
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				3,000			
4	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900	m	9,000	2 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	200,000	80,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	94,320	205,00	19 335,60	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				94,320			
8	K	129353101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tříd těžitelnosti II skupiny 4 strojně Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozem rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	12,100	1 000,00	12 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				12,100			
9	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,750	500,00	6 375,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				12,750			
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tříd těžitelnosti II. skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	119,170	300,00	35 751,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				119,170			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	119,170	20,00	2 383,40	CS ÚRS 2020 01
	PP							
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	214,506	200,00	42 901,20	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				119,170			
	VV				214,506			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	72,440	200,00	14 488,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				72,440			
14	M	58337344	Štěrkopisek frakce 0/32 štěrkopisek frakce 0/32	t	130,392	250,00	32 598,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				130,392			
D	2		Zakládání				127 291,44	
15	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	4,896	2 640,00	12 925,44	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	VV				4,896			
16	K	212792311	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 110 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 110	m	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
17	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	3,410	2 850,00	9 718,50	CS ÚRS 2020 01

24 70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15					
	VV		0,065*18"podklad drenáže		1,170			
	VV		1,7*4*0,1*2		1,360			
	VV		1,1*4*0,1*2		0,880			
	VV		Součet		3,410			
18	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	0,525	2 980,00	1 564,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20					
	VV		0,35*0,5*3		0,525			
19	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	9,900	3 530,00	34 947,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	VV		9,9		9,900			
20	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	22,760	1 000,00	22 760,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
	VV		22,76		22,760			
21	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	22,760	100,00	2 276,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
22	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	1,180	35 000,00	41 300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		1,18		1,180			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				237 110,69	
23	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vřrtu	kus	10,000	1 060,00	10 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vřrtu					
24	M	548792020	kotva pro uchycení římsy do vřrtu	kus	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kotva pro uchycení římsy do vřrtu					
25	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,170	4 760,00	5 569,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Římsy ze železového betonu C 30/37					
	VV		3,9*0,15*2		1,170			
26	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	8,020	1 780,00	14 275,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostních říms zřízení všech tvarů					
	VV		3,9*0,9*2+0,5*0,5*4		8,020			
27	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	8,025	150,00	1 203,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostních říms odstranění všech tvarů					
28	K	317353311	Vložení matrice do bednění mostních říms	m2	1,170	150,00	175,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostních říms vložení matrice do bednění					
	VV		3,9*0,05*3*2		1,170			
29	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,176	35 000,00	6 160,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		1,17*0,15		0,176			
30	K	334213111	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	7,040	6 730,00	47 379,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo piliřů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3					
	VV		1,6*0,5*2,2*4		7,040			
31	K	334213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	m3	7,040	950,00	6 688,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zdivo piliřů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za licování zdiva jednostranné					
32	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	8,136	3 790,00	30 835,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
	VV		8,136		8,136			
33	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	40,240	1 000,00	40 240,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
	VV		40,24		40,240			
34	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	40,240	100,00	4 024,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
35	K	334361216	Výztuž dřívků opěr z betonářské oceli 10 505	t	1,220	35 000,00	42 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, piliřů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřívků opěr					
	VV		1,22		1,220			
36	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	8,000	320,00	2 560,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms					
37	M	55391530	zábradelní systém Pz bez výplně	m	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zábradelní systém Pz bez výplně					
38	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Chránička kabelů v římsě z trub HDPE přes DN 80 do DN 110					
	D	4	Vodorovné konstrukce				102 118,00	
39	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	3,380	4 500,00	15 210,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37					
	VV		3,38		3,380			
40	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	4,820	800,00	3 856,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm					
	VV		4,82		4,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	4,820	200,00	964,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm					
42	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,720	50 400,00	36 288,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS: 500 deskového mostu					
	VV		0,72		0,720			
43	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	8,800	1 000,00	8 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek					
	VV		4*2,2		8,800			
44	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	8,800	600,00	5 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek					
45	K	428382111	Osazení vrubového kloubu z prefa dílu	kus	8,000	1 550,00	12 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vrbový a plovový kloub železobetonový osazení vrubového kloubu z prefa dílu					
46	M	31197011	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24	m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		lyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24					
	VV		8,000*0,75		6,000			
47	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prošťkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	8,800	1 600,00	14 080,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		10*2,2*0,4		8,800			
48	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	22,000	170,00	3 740,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	D	5	Komunikace pozemní				35 768,00	
49	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	22,400	410,00	9 184,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		4*2,8*2		22,400			
50	K	573211108	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,40	m2	36,800	15,00	552,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		3,6*4+22,4		36,800			
51	K	573211112	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,40	m2	22,400	25,00	560,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
52	K	577135142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	14,400	325,00	4 680,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 40 mm					
	VV		3,6*4		14,400			
53	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	36,800	355,00	13 064,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm					
54	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	22,400	345,00	7 728,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 50 mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				107 660,00	
55	K	919121111	Rezáni dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živiněm krytu	m	15,200	130,00	1 976,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rezáni dilatačních spár v živiněm krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm					
	VV		7,2+8		15,200			
56	K	919121112	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	15,200	115,00	1 748,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního náteru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
57	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložním šablony do bednění	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložním šablony do bednění					
58	K	948411121	Zřízení podpěry dočasné kovové Pížmo výšky do 12 m	t	1,200	2 560,00	3 072,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení podpěr výšky do 12 m Pížmo					
59	K	948411221	Odstranění podpěry dočasné kovové Pížmo výšky do 12 m	t	1,200	2 075,00	2 490,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění podpěr výšky do 12 m Pížmo					
60	K	948411921	Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové Pížmo výšky do 12 m	t	1,200	990,00	1 188,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné podpěr výšky do 12 m Pížmo					
61	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene Imel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
62	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
63	K	961041221	Bourání mostních základů z betonu prokládaného	m3	8,000	2 500,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí základů z prokládaného betonu					
64	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	14,080	1 700,00	23 936,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí zdí a pilířů z kamene nebo cihel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	963051111	8*2,2*0,4*2 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	4,500	7 500,00	33 750,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železobetonu					
66	K	963071111	15*0,3 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	250,000	50,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotností do 100 kg					
67	K	997221571	D 997 Přesun sutě Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	77,333	605,00	86 239,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km				46 786,47	CS ÚRS 2020 01
68	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	309,332	20,00	6 186,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
69	K	997221611	77,333*4 'Přepočtené koeficientem množství Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,333	165,00	12 759,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
70	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	63,000	265,00	16 695,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
71	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,300	350,00	2 205,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
72	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,033	200,00	1 606,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
73	K	998212111	D 998 Přesun hmot Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	176,152	80,00	14 092,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				14 092,16	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 868,60	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 868,60	
74	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	17,600	25,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
75	M	11163150	4*2,2*2 lak penetrační asfaltový	t	0,006	60 000,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
76	K	711112002	17,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	17,600	25,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
77	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,008	50 000,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
78	K	711311001	17,6*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	14,400	50,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace mostovek nátěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním					
79	M	111631500	3,6*4 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,004	55 000,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
80	K	711331382	14,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	14,400	20,00	288,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny					
81	M	JTA.0013477.UR	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře 300cm	m2	16,560	30,00	496,80	
	PP		geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře 300cm					
82	K	711341564	14,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením M&D	m2	28,800	100,00	2 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením M&D					
83	M	628361100	14,4*2 pás těžký asfaltovaný FOALBIT AI S 40	m2	4,600	130,00	598,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás těžký asfaltovaný s AI fólií nosnou vložkou					
84	M	62852015	4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerální posypem na horním povrchu	m2	33,120	165,00	5 464,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerální posypem na horním povrchu					
85	K	711471053	28,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě	m2	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		termoplastv volně položenou fólií z nízkolehčeného PE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii z nízkolehčeného PE položenou volně 8,000*1*2		16,000			
86	M	28323100	folie LDPE (750 kg/m ³) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	16,000	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		folie LDPE (750 kg/m ³) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm					
87	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům v objektech výškv do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,241	1 000,00	241,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				198 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				110 000,00	
88	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
89	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
90	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření, geometrický plán	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě - zaměření, geometrický plán					
91	K	013203000	Dokumentace stavby - 1HMP	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace stavby - 1HMP					
92	K	013244000	Dokumentace realizační	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace realizační					
93	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
94	K	01325400R	mostní list	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		mostní list					
D VRN3			Zařízení staveniště				57 000,00	
95	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
96	K	03420300R	vytyčení a ochrana sítí	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		vytyčení a ochrana sítí					
	P		Poznámka k položce: včetně ochrany chráničů ČEZ					
97	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi včetně světelné signalizace					
98	K	035103005	Pronájem objektů - provizorní most	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Pronájem objektů - provizorní most					
	P		Poznámka k položce: osazení montovaného provizorního mostu dl. 9m včetně uložení na šlátkové lože, silniční panely 6ks, osazení DZ a provedení 1HMP a PD. Součástí je vybudování příjezdových cest 60m2 z r-malenálu.					
D VRN4			Inženýrská činnost				31 000,00	
99	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Autorský dozor projektanta					
100	K	042903000	Ostatní posudky - DIO	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ostatní posudky - DIO					
101	K	042903000R	Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán					

POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,


nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340

výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.


aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.

Dne 1.dubna 2020


SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ing.Dušan Drahoš
předseda představenstva



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva



Ing.Josef Horáček
člen představenstva



Pověření přijímám :

Petr Podrazil

